Harmonogram projektu Národní akční plán Adaptace

Příloha 2 ŘD NAP adaptace

#	Úroveň	Zpracování NAP adaptace	Termín zahájení	Termín dokončení	Návaznost	Zodpovědná osoba	Spolupracující osoby	Klíčové výstupy	Poznámka
0	Proces	**Identifikace potřeby tvorby strategie**	**26.10.2015**	**23.11.2015**					
0.1	Aktivita	Iniciace potřeby vytvoření materiálu		X					vyplývá z UV Č. 861/2015
0.2	Aktivita	Zadání zpracování informace o zahájení projektu							
0.3	Aktivita	Příprava k zahájení projektu				Ř Klápště			
0.4	Aktivita	Schválení zahájení projektu gestorem		23.11.2015	0.3	NM Dolejský			
0.5	Aktivita	Předložení informace o zahájení projektu zadavateli		23.11.2015	0.4	ministr			
1	Proces	**Nastavení projektu**	**23.11.2015**	**23.12.2015**					
1.1	Aktivita	**Jmenování vedoucích pracovních skupin**		**14.12.2015**		Ř Klápště			
1.1a		rozeslání žádostí o nominaci - IS/oslovení ŘO	10.12.2015	14.12.2015	0.5	Ř Klápště		interní sdělení	
1.2	Aktivita	**Obsazení pracovních skupin**	14.12.2015	**17.12.2015**	1.1				
1.2a		určení složení jednotlivých pracovních skupin (organizace)	10.12.2015	14.12.2015		vedoucí PS			zastoupení organizací v PS
1.2b		schválení složení pracovních skupin	10.12.2015	14.12.2015		Ř Klápště			
1.2c		interní obsazení pracovních skupin - IS	10.12.2015	21.12.2015		Ř Klápště		interní sdělení	jmenovité zastoupení
1.2d		rozeslání žádostí o nominaci - dopis	10.12.2015	21.12.2015	0.5	ministr		dopis	
1.3	Aktivita	**Vytvoření Plánu spolupráce a komunikace**		**10.12.2015**	0.5	Franková, Horecký, Tóbiková	Ř Klápště	Plán spolupráce a komunikace	
1.4	Aktivita	**Vytvoření Plánu řízení rizik**		**10.12.2015**	0.5	Franková, Horecký, Tóbiková	Ř Klápště	Plán řízení rizik	
1.5	Aktivita	**Kompletace ŘD**		**10.12.2015**	1.1 až 1.4	Franková, Horecký, Tóbiková		návrh Řídícího dokumentu	
1.6	Aktivita	**Schválení řídícího dokumentu projektu (vč. VPŘ, PV)**		**31.12.2015**	1.5	PV/ministr			
1.6a		předložení Řídícího dokumentu do VPŘ		10.12.2015		NM Dolejský		interní sdělení	
1.6b		VPŘ	10.12.2015	16.12.2015		VPO			
1.6c		zapracování připomínek	16.12.2015	18.12.2015		Franková, Horecký, Tóbiková		přepracovaný Řídící dokument	
1.6d		předložení Řídícího dokumentu PV ke schválení (úkoly pro VPO)		18.12.2015		NM Dolejský		zápis z PV, vč. úkolů pro VPO	
1.6e		Schválení Řídícího dokumentu		31.12.2015		PV/ministr		Řídící dokument	
1.6f		Informace na RVUR		8.1.2016		NM Dolejský		Řídící dokument	
2	Proces	**Zpracování NAP adaptace**	**31.12.2015**	**31.12.2016**					
2.0		**Příprava prostředí pro spolupráci:**		**31.12.2015**		Franková, Horecký, Tóbiková			
		vytvoření a strukturalizace platformy pro sdílení dokumentů - TeamRoom		31.12.2015		Franková, Horecký, Tóbiková			
		vytvoření dokument-managementu		31.12.2015		Franková, Horecký, Tóbiková			
2.1	Aktivita	**Určení bílých míst Komplexní studie**	1.12.2015	**31.12.2015**	0.5	externí dodavatel		zpráva	
2.2	Aktivita	**Zpracování podkladových studií**	10.12.2015	**31.5.2016**	2.1				
2.2a		příprava zadávací dokumentace	10.12.2015	31.12.2015	1.6	Franková, Horecký, Tóbiková		dokumentace pro veřejnou zakázku	
2.2b		výběrové řízení	1.1.2015	15.2.2016	2.2a	Ř Klápště		výběr externího dodavatele	
2.2.c		zpracování podkladových studií	15.2.2016	15.5.2016	2.2b	externí dodavatel			
2.2.d		posouzení a převzetí podkladových studií,	15.5.2016	31.5.2016	2.2.c	vedoucí PS/projektová kancelář			
2.2e		akceptace výstupů - studie, analýzy…	15.5.2016	31.5.2016	2.2.d	Ř Klápště		Studie	
2.3	Aktivita	**Návrh jednotlivých kapitol a opatření**	1.1.2016	**30.6.2016**	1.7	vedoucí PS			
2.3a		první setkání pracovních skupin	1.1.2016	22.2.2016	1.6f	vedoucí PS			
2.3b		vypracování podkladů pro jednotlivé kapitoly a opatření	15.1.2016	31.5.2016	2.3a	pracovní skupiny		návrhy textů kapitol	
2.3c		setkání Meziresortní pracovní skupiny (měsíčně)	29.1.2016	30.9.2016	2.2 a 2.3	Ř Klápště		návrhy textů kapitol, kompletovaný dokument	
2.3d		setkání Řídícího výboru (kvartálně)	1.2.2016	30.9.2016	2.2 a 2.3	NM Dolejský		návrhy textů kapitol, kompletovaný dokument	
2.4	Aktivita	**Kompletace dokumentu**	1.6.2016	**30.6.2016**	2.2 a 2.3				
2.4a		kompletace podkladů, doplnění dle podkladových analýz	1.6.2016	18.6.2016		vedoucí PS	Franková, Horecký, Tóbiková		
2.4b		souhrnná editace	20.6.2016	30.6.2016	2.4a	Franková, Horecký, Tóbiková			
2.4c		schválení dokumentu koordinátorem	30.6.2016	30.6.2016	2.4b	Ř Klápště		kompletní a zeditovaný text dokumentu	
2.5	Aktivita	**Expertní oponentura návrhu NAP**	1.7.2016	**31.7.2016**	2.4c	externí zpracovatel		Studie, doporučení	
2.6	Aktivita	**Projednání RVUR (vybraných výborů)**	1.7.2016	**31.7.2016**	2.4c	NM Dolejský		Doporučení	
2.7	Aktivita	**Veřejné Forum k návrhu NAP**	1.7.2016	**31.7.2016**	2.4c	NM Dolejský		Doporučení	
2.8	Aktivita	**Externí projekt - kauzální smyčky**	1.7.2016	**31.7.2016**	2.4c	externí dodavatel		Studie, doporučení	
2.7a		**Dopracování materiálu dle oponentury a veřejného fora**	1.8.2016	**31.8.2016**	2.5 až 2.8	pracovní skupiny / Franková, Horecký, Tóbiková		kompletní zoponovaný dokument	
2.8	Aktivita	**Schválení NAP adaptace PV MŽP**	1.9.2016	**30.9.2016**	2.7a	PV/ministr			
2.8a		předložení do VPŘ	1.9.2016	1.9.2016	2.7a	NM Dolejský			
2.8b		VPŘ	1.9.2016	15.9.2016	2.8a	VPO			
2.8c		vypořádání připomínek	15.9.2015	22.9.2016	2.8b	Franková, Horecký, Tóbiková	vedoucí PS		
2.8d		Předložení NAP adaptace PV MŽP		23.9.2016	2.8c	NM Dolejský			
2.8e		Schválení NAP adaptace PV MŽP	26.9.2016	30.9.2016	2.8d	PV/ministr	Porada vedení	finální dokument se zapracováním VPŘ	
2.9	Aktivita	**MPŘ**	30.9.2016	**30.11.2016**	2.8e	NM Dolejský			
2.9a		předložení do MPŘ	30.9.2016	30.9.2016	2.9	NM Dolejský			
2.9b		MPŘ	30.9.2016	14.10.2016	2.9a	resorty, veřejnost			
2.9c		vypořádání připomínek	17.10.2016	30.11.2016	2.9b	Franková, Horecký, Tóbiková	vedoucí PS		
2.10.	Aktivita	**Schválení NAP adaptace PV MŽP**	1.12.2016	13.12.2016	2.9c	PV/ministr		finální dokument	
2.10a		Předložení NAP adaptace PV MŽP	1.12.2016	2.12.2016	2.9c	NM Dolejský		finální dokument se zapracováním MPŘ	
2.10b		Schválení NAP adaptace PV MŽP	5.12.2016	13.12.2016	2.10a	PV/ministr		finální dokument	
2.11	Aktivita	**Předložení NAP adaptace ke schválení Vládou ČR**	14.12.2016	**31.12.2016**	2.10b	NM Dolejský			
3	Proces	**Uzavření projektu**	**1.1.2017**	**31.1.2017**					

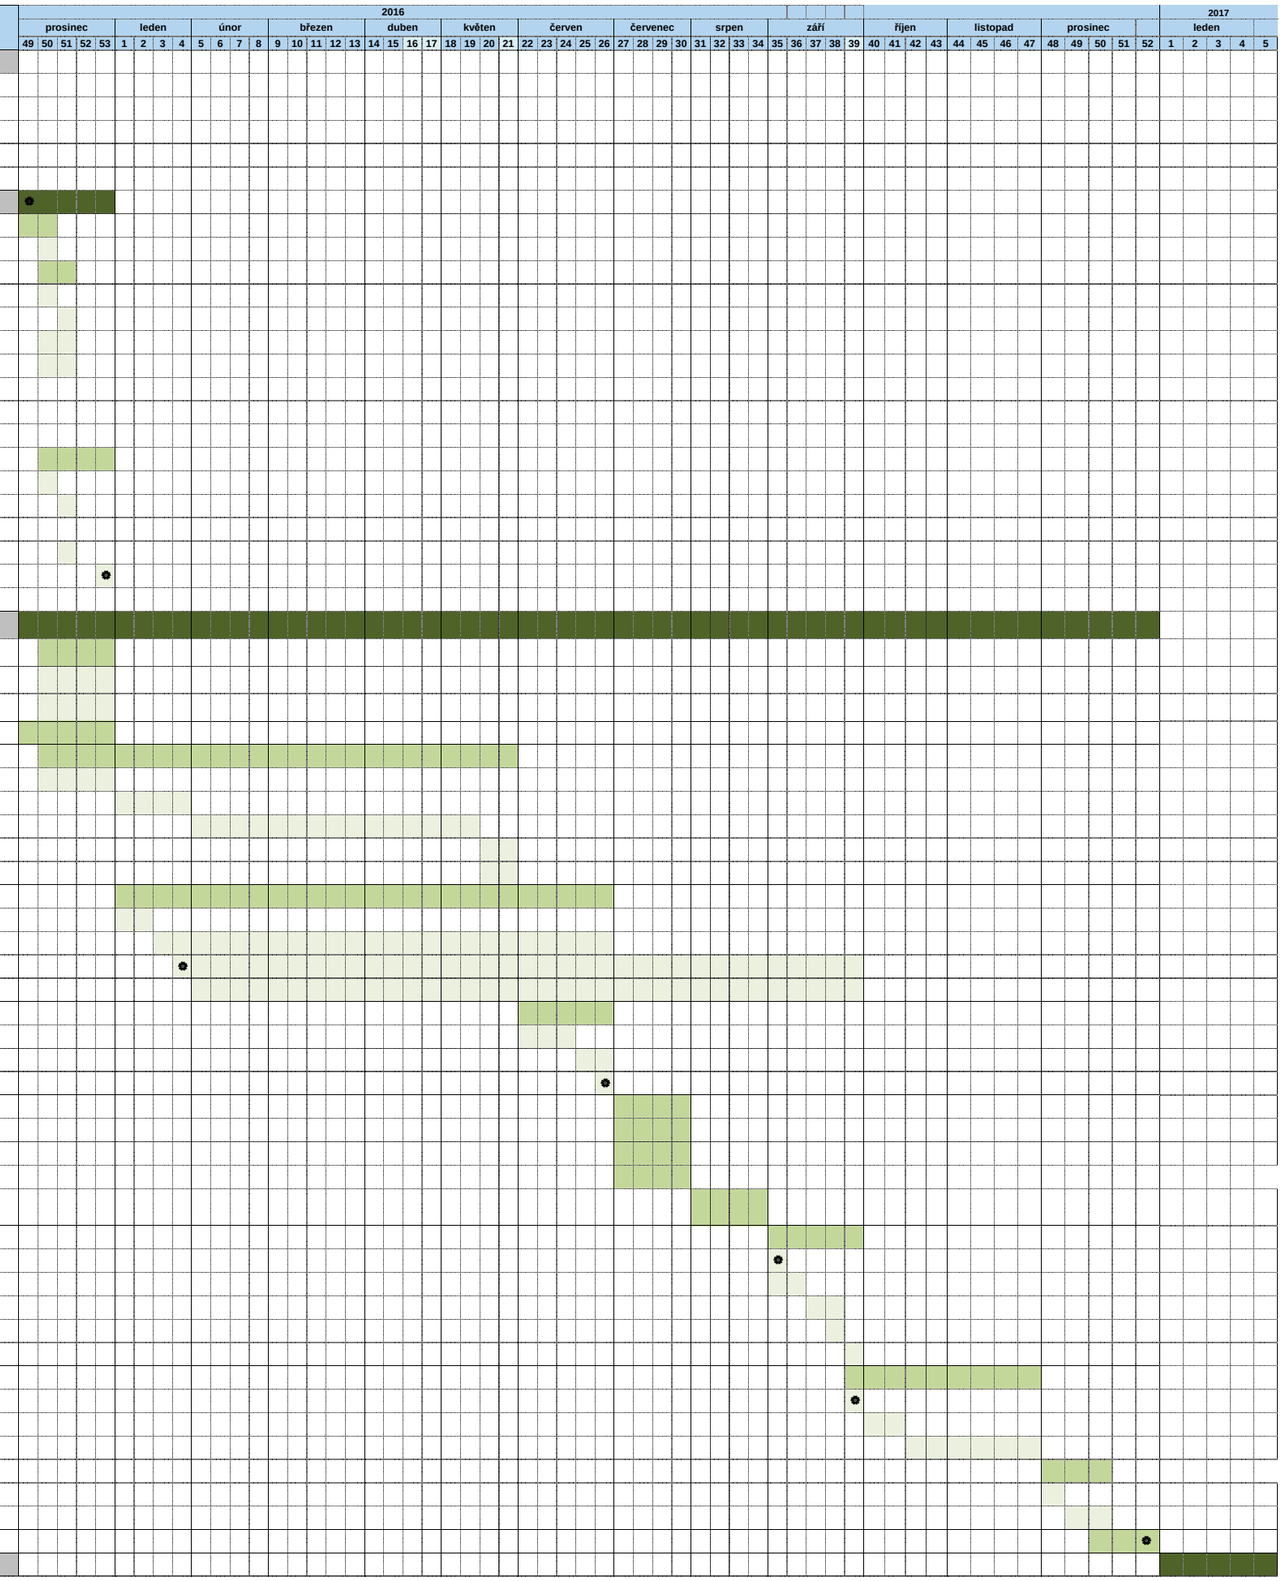

Harmonogram projektu Národní akční plán Adaptace

Příloha 2 ŘD NAP adaptace

3.1	Aktivita	**Vypracování Závěrečné zprávy projektu**	1.1.2017	**20.1.2017**	2.11	Ř Klápště	Franková, Horecký, Tóbiková		
3.2	Aktivita	**Předložení Závěrečné zprávy ke schválení**	23.1.2017	**25.1.2017**	3.1	Ř Klápště	Franková, Horecký, Tóbiková		
3.3	Aktivita	**Schválení Závěrečné zprávy projektu**	25.1.2017	**31.1.2017**	3.1	NM Dolejský		Závěrečná zpráva	
3.4	Aktivita	**Grafické zpracování a tisk materiálu**	1.1.2017	**31.1.2017**	2.9	Ř Klápště		Graficky upravený a vytištěný dokument	
